



LAVORI IN CORSO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

GIUGNO 2011

1) OPERE STRADALI

1) Completamento Tangenziale sud nel tratto tra il Torrente Rovacchia e l'incrocio di Cabriolo

Importo lavori euro 6.600.403,70
Impresa esecutrice: Consorzio Cooperativa Costruzioni CCC Società Cooperativa di Bologna
Consegna lavori: 30/11/2009
Ultimazione prevista: 25/06/2011
Responsabile del procedimento: ing. Clara Caroli

2) Interventi di messa in sicurezza e ripristino strada comunale di Cogolonchio

Importo lavori: euro 100.031,72
Impresa esecutrice: Ghidini Oribio di San Polo di Torrile
Consegna lavori: 15/09/2010
Ultimazione lavori: lavori ultimati
Responsabile del procedimento: ing. Clara Caroli

3) Programma manutenzione strade comunali 2011

Importo lavori: euro 145.570,30
Impresa esecutrice: ZE.BA snc di Fidenza
Consegna lavori: 31/03/2011
Ultimazione lavori: 30/03/2012
Responsabile del procedimento: ing. Arcangelo Menna

2) EDIFICI COMUNALI

4) Contratti aperti 2011

Opere elettriche:
Impresa esecutrice: CA.VI.MA s.n.c di Fidenza
Importo lavori durata 4 mesi: euro 6.826,17

Opere falegnameria:
Impresa esecutrice: Tuffarelli Gabriele Restauro mobili di Fidenza
Importo lavori durata 4 mesi: euro 8.227,33

Opere idrauliche:
Impresa esecutrice: Dall'Ovo William di Fidenza
Importo lavori durata 4 mesi: euro 8.319,50

Opere di lattoneria:
Impresa esecutrice: FRANZONI MAURIZIO di Soragna

Importo lavori durata 4 mesi: euro 3.980,67
Consegna lavori: 18/05/2010
Ultimazione lavori: 17/05/2011

Opere edili:
Impresa esecutrice: Fava Andrea
Importo lavori durata 4 mesi: euro 5.644,95
Consegna lavori: marzo 2011
Ultimazione lavori: luglio 2011

5) Rifacimento coperture degradate nel Cimitero di Castione Marchesi e della terrazza di Palazzo Porcellini

Importo lavori: euro 25.002,09
Impresa esecutrice: Edildomus Srl di Fidenza
Consegna lavori: 7/02/2011
Ultimazione lavori: 07/06/2011
Responsabile del Procedimento: arch. Cecilia Amighetti

3) EDIFICI SCOLASTICI

6) Adeguamento sismico di edifici scolastici scuola IL SEME

Importo lavori: euro 167.886,80
Impresa esecutrice: Cooperativa Edile Artigiana di Parma
Consegna lavori: 08/06/2011
Ultimazione prevista: 17/08/2011
Responsabile del procedimento: arch. Cecilia Amighetti

7) Riqualificazione edifici scolastici 2011

Importo lavori: euro 114.272,38
Impresa esecutrice: F.lli Aiello Costruzioni di Reggio Emilia
Consegna lavori: 27/06/2011
Ultimazione prevista: 26/08/2011
Responsabile del procedimento: arch. Cecilia Amighetti

4) TEATRO

8) Completamento opere di restauro e messa in sicurezza Teatro Magnani. II° stralcio

Importo lavori: euro 63.726,00
Impresa esecutrice: Pietro Tranchina di Modena
Consegna lavori: 02/05/2011
Ultimazione lavori: 04/09/2011
Responsabile del Procedimento: ing. Clara Caroli

5) VERDE PUBBLICO

9) Manutenzione del verde urbano 2011 1° stralcio

Importo lavori: euro 120.674,23
Impresa esecutrice: Suardi srl di Cremona
Consegna lavori: 23/03/2011
Ultimazione prevista: 22/03/2012
Responsabile del procedimento: arch. Amighetti Cecilia

10) Manutenzione del verde urbano 2011 2° stralcio

Importo lavori: euro 87.633,22
Impresa esecutrice: Coop.va Averla di Fontanellato
Consegna lavori: 21/03/2011
Ultimazione prevista: 20/03/2012
Responsabile del procedimento: arch. Amighetti Cecilia

11) Riqualificazione del verde urbano 2011 1° stralcio

Importo lavori: euro 43.773,09
Impresa esecutrice: F.lli Bonzani Costruzioni snc di Varano de Melegari (PR)
Consegna lavori: 27/06/2011
Ultimazione prevista: 26/08/2011
Responsabile del procedimento: arch. Cecilia Amighetti

6) IMPIANTI SPORTIVI

12) Fornitura e posa di acquascivolo c/o la piscina scoperta "Guatelli" di Fidenza


Progetto realizzato congiuntamente a FIDENZA SPORT
Importo lavori: euro 48.000,00
Impresa esecutrice: NEW DIERESIN 2000 Srl
Consegna fornitura e posa: marzo 2011
Ultimazione prevista: 27/05/2011
Responsabile del procedimento: dr. Lorenzo Dodi
Supporto tecnico al RUP: ing. Clara Caroli

13) Riqualificazione spogliatoi piscina Guatelli

Progetto realizzato congiuntamente a FIDENZA SPORT
Importo lavori: euro 109.410,71
Impresa esecutrice: G.C Costruzioni snc di Medesano
Consegna lavori: 4/04/2011
Ultimazione prevista: 04/07/2011
Responsabile del procedimento: dr. Lorenzo Dodi
Supporto tecnico al RUP: ing. Clara Caroli



Completamento tangenziale sud nel tratto tra il torrente Rovacchia e l'incrocio di Cabriolo

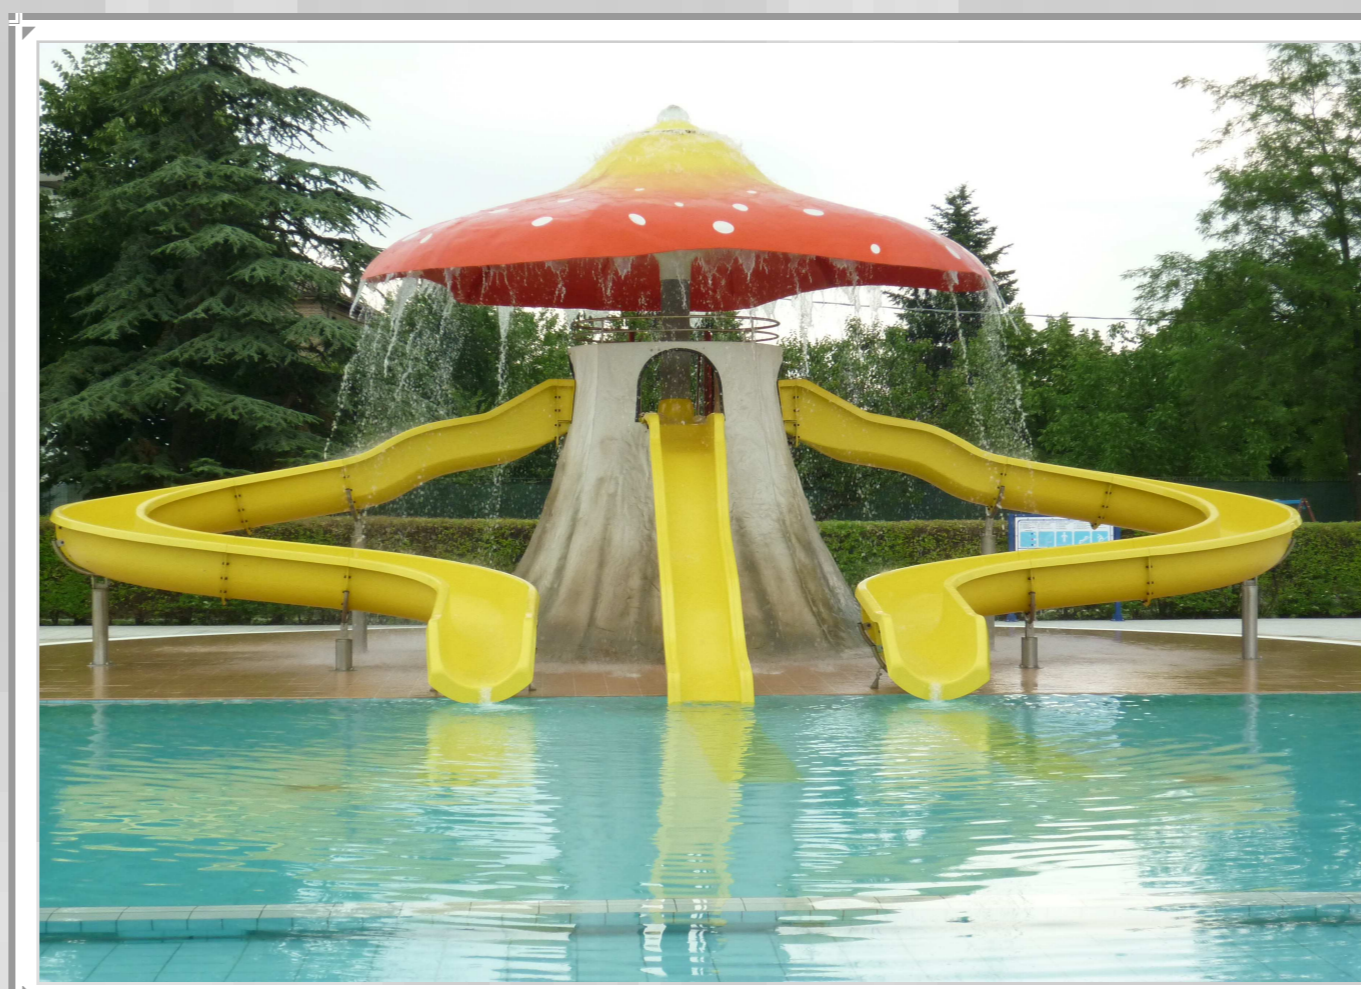

Riqualificazione impianti sportivi 2011
